



Давлат Ташкилотларида ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШ фани

4-Мавзу: Лойиҳаларнинг таснифи ва стратегияси: Инвестицион сиёсатнинг асосий тамойиллари ва механизмлари

Дарс режаси

- ❑ Лойиҳанинг кўламини аниқлаш
 - Лойиҳалар кўламини аниқлашнинг назорат рўйхати
- ❑ Лойиҳанинг устивор мақсадларини белгилаш
- ❑ Лойиҳа бошқарувида ишларни тақсимлаш (WBS)
 - Ишлар тақсимотидаги асосий груҳлар
 - Ишлар тақсимотининг менежер учун ёрдами
 - Оддий ишлар тақсимотини тузиш
- ❑ Ишлар тақсимотини ташкилотга интеграция қилиш
- ❑ Ишлар тақсимотини АКТ учун кодлаш
- ❑ Масъулият матрицаси
- ❑ Лойиҳа алоқа воситасининг режаси




Лойиҳанинг кўламини аниқлаш

- ❑ Лойиҳалар кўламини аниқлашнинг назорат рўйхати
 - Лойиҳа мақсади
 - Лойиҳа босқичлари
 - Техник талаблар
 - Чегара ва истиснолар
 - Мижоз билан қайта кўриб чиқиш



Лойиҳанинг устивор мақсадларини белгилаш




	Вақт	Ижро	Нарх
Чеклов		●	
Ривожлантириш	●		
Қабул қилиш			●

Лойиҳанинг ишларини майда қисмларга бўлиш (WBS)

- Лойиҳалардаги майда ишлардаги асосий гуруҳлар
- Ишлар тақсимотининг менежер учун ёрдами
- Оддий ишлар тақсимотини тузиш
 - Ишнинг таснифи (нима?)
 - Ишни тугатиш учун вақт-муддатларни белгилаш (қанча муддат давом этади?)
 - Ишни тугатиш учун муддатларга асосланган бюджет/маблағни аниқлаш (харажат?)
 - Ишни тугатиш учун ресурсларни аниқлаш (қанча?)
 - Ҳар бир иш учун масъул шахсларни белгилаш (ким бажаради?)
 - Жараённи баҳолаш учун назорат нуқталарини белгилаш (қанчалик яхши?)


Лойиҳа бошқарувида ишларни тақсимлаш

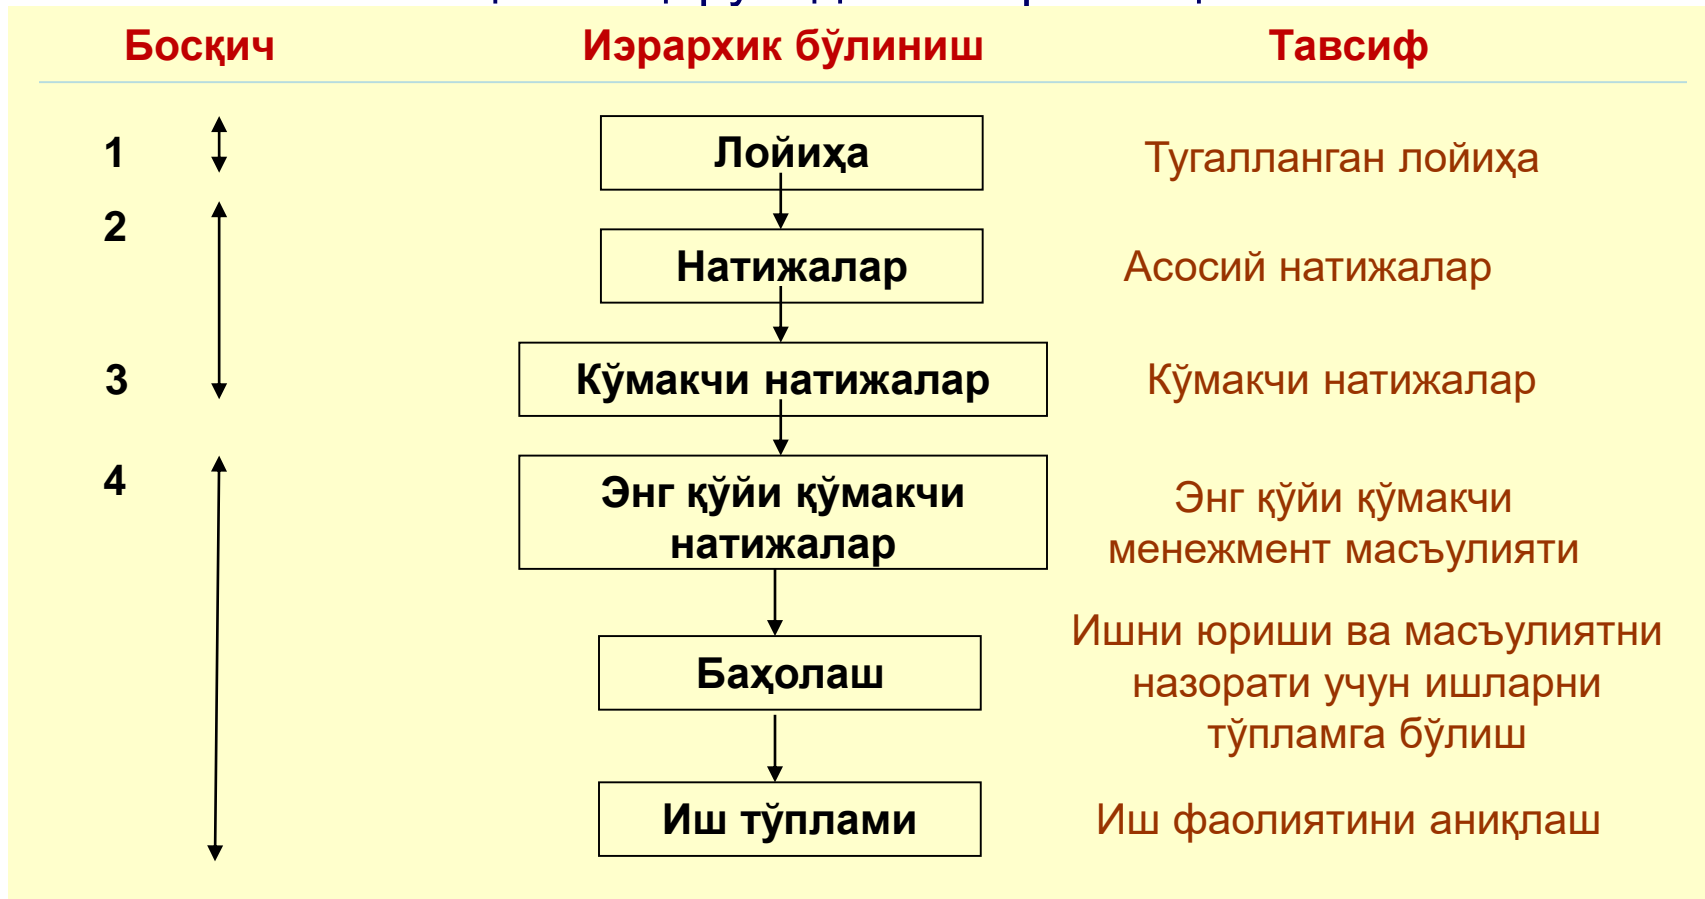

Лойиҳа бошқарувида ишларни майда қисмларга бўлиш



Ferrari

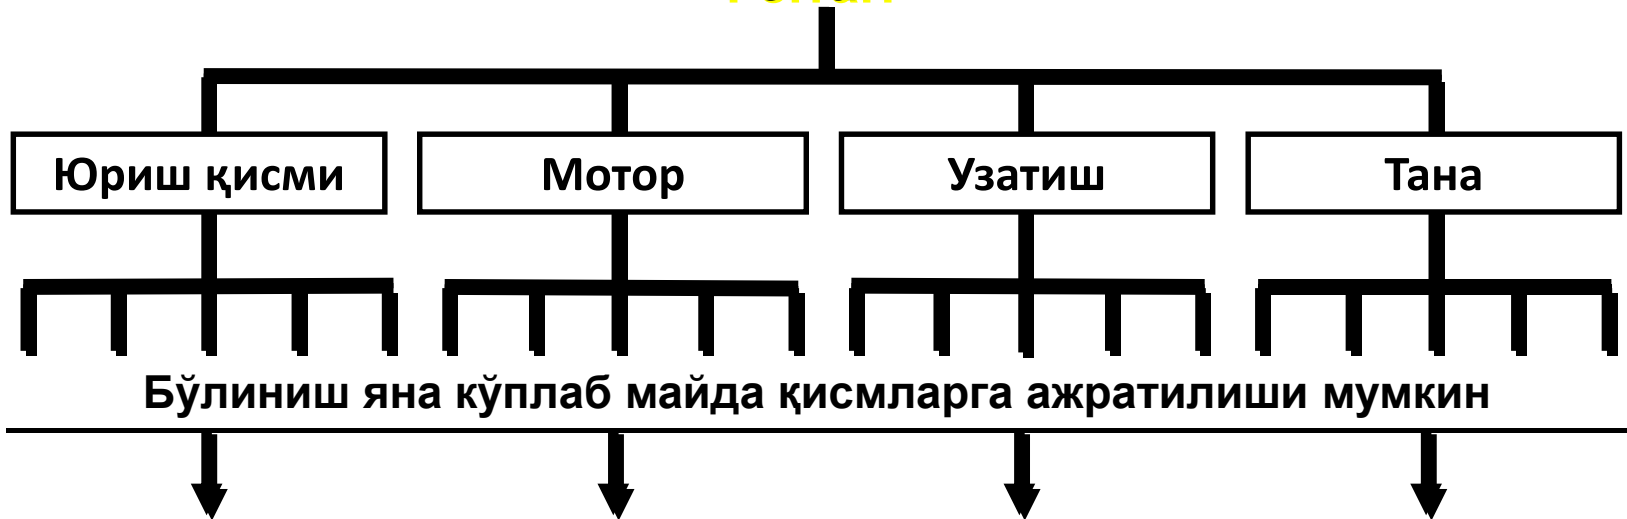

Диссертация

Қисқача баёни

Тадқиқот мақсадлари

Тадқиқот муаммоси

Тадқиқот услуби

Статистик таҳлил услуби

Адабиётларни қидириш услуби

Адабиётлар таҳлили

Адабиётлар таҳлили

Тадқиқот муаммоси ва илмий фараз

Илмий раҳбар учун ҳисобот

Тақриз асосида тўғирлаш

Методология

Тадқиқот шаклини белгилаш

Танлов гуруҳи

Саволнома тайёрлаш

Статистик таҳлил қилиш

Методология чекловларини аниқлаш

Тадқиқот шакли

Саволнома ўтказиш

Маълумотларни киритиш

Топилмалар таҳлили

Топилмалар мунозараси


Ҳулоса, чекловлар, бошқарувга таъсир, келгуси тадқиқот

Топшириш


Тақриз учун қоралама

Тўғирлаш, ўзгартириш ва топшириш

Стратегия жараёни

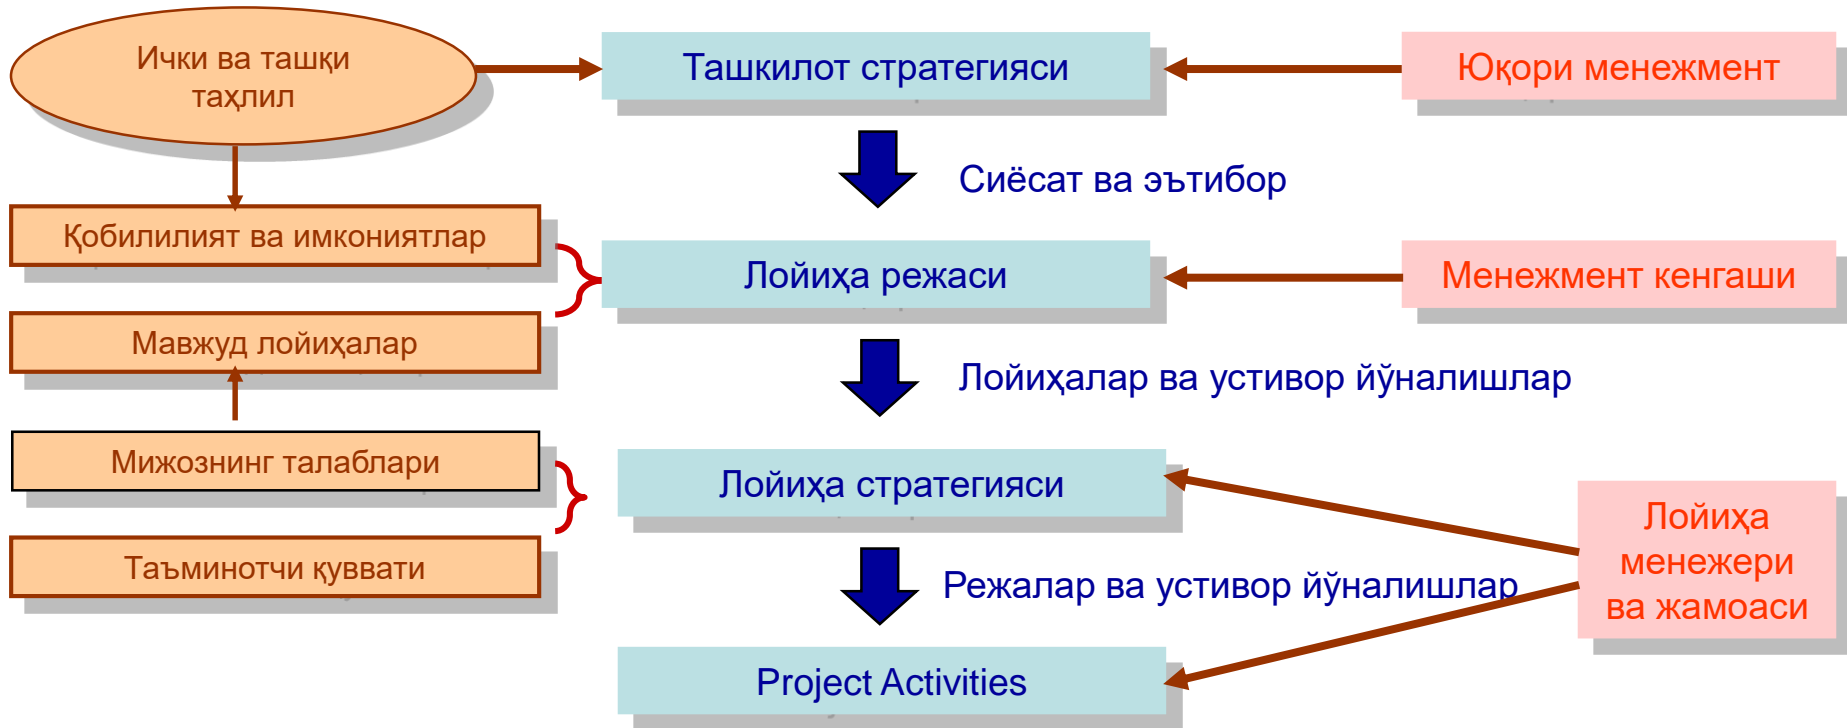

Нурободдаги кўл лойиҳаси

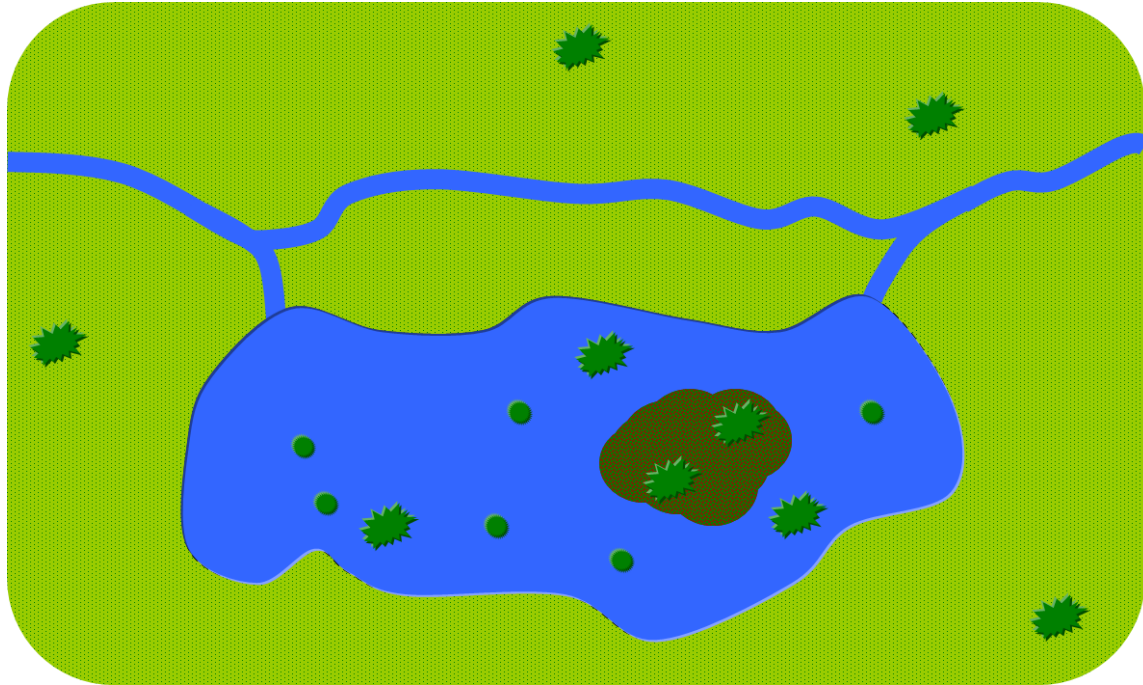

ТАЪРИФ

Эҳтиёж, муаммо,
имкониятни
аниқлаш

Лойиҳа
мақсадларини
белгилаш

Ресурсларни
Дастлабки
баҳолаш

Лойиҳа
рискларини
аниқлаш

Пудратчиларни
таклиф қилиш

Муаммони аниқлаштириш

- Маҳфий тажриба амалиёти
- Генетика мухандислиги институти томонидан амфибия турларини келтириш
- Кўлни барпо қилиш
- Миллий фанлар академияси “ботаника кўли” учун \$250 000 ажратди



ТАЪРИФ

Эҳтиёж, муаммо,
имкониятни
аниқлаш

Лойиҳа
мақсадларини
белгилаш

Ресурсларни
дастлабки
баҳолаш

Лойиҳа
рискларини
аниқлаш

Пудратчиларни
таклиф қилиш

Муаммони аниқлаштириш

- 4 та экскаватор
- 2 та юк машинаси
- 6 та эксперт (1 ландшафт дизайнери, 2 геолог, 2 ботаник, 1 биолог)



ТАЪРИФ

Эҳтиёж, муаммо,
имкониятни
аниқлаш

Лойиҳа
мақсадларини
белгилаш

Ресурсларни
Дастлабки
баҳолаш

Лойиҳа
рискларини
аниқлаш

Пудратчиларни
таклиф қилиш

Муаммони аниқлаштириш

- Лойиҳани 6 ой ичида якунлаш
- Лойиҳага ажратилган \$250 000 бюджетдан четга чиқмаслик
- Ерни тайёрлаш
- Фундамент ва сув тўлдириш
- Табиий муҳит барпо этиш



ТАЪРИФ

Эҳтиёж, муаммо,
имкониятни
аниқлаш

Лойиҳа
мақсадларини
белгилаш

Ресурсларни
дастлабки
баҳолаш

Лойиҳа
рискларини
аниқлаш

Пудратчиларни
таклиф қилиш

Муаммони аниқлаштириш



- _____
- _____
- _____

Фойдаланилган адабиётлар

1. Larson, C & Grey, E (2006) Project Management: The Managerial Process”, international edition, McGraw Hill, chapter 1.
2. Burke, R. (2011) Project Management Techniques, chapter 1.
3. Newton, R. (2009) The practice & theory of Project Management, Creating Value through change, chapters 1, 7.
4. PMBOK Guide (2008) A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, www.pmi.org
5. Руководство к своду знаний по управлению проектами. (Руководство PMBOK®)— Четвертое издание. 2008 Project Management Institute.
6. Patanakul, P. et al (2010) *An empirical study on the use of project management tools and techniques across project life-cycle and their impact on project succes.* Journal of General Management, 35(3).
7. *Andersen, E. (2010) Are we getting any better? Comparing Project Management in the Years 2000 and 2008. Project Management Journal, 41 (4), 4-16.*
8. International Project Management Association, www.ipma.ch

Эътиборингиз учун раҳмат!
